Los 8 Flechtingen; Ausbau eines FTTB-Netzes Bereich Flechtingen
auf Basis Bauauftrag vom 17.07.2019 mit 65% HA

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	Auftragseingang	1 Tag	Mit 27.06.18	Mit 27.06.18
2	Planung	300 Tage	Mon 02.07.18	Fre 23.08.19
3	E-Planung	92 Tage	Mon 06.08.18	Die 11.12.18
4	Freigabe E-Planung	20 Tage	Mit 12.12.18	Die 08.01.19
5	Materialbeauftragung Kostenprogn.	2 Tage	Mit 09.01.19	Don 10.01.19
6	Einkauf	40 Tage	Fre 11.01.19	Don 07.03.19
7	G-Planung	25 Tage	Mit 09.01.19	Die 12.02.19
8	Freigabe G-Planung	10 Tage	Mit 13.02.19	Die 26.02.19
9	Ausführungsplanung	75 Tage	Mit 27.02.19	Die 11.06.19
10	**Behinderung, nicht vom AN zu vertreten (Datenbank/ Avacon/ fehlende Angaben)**	855 Tage	Mon 02.07.18	Mon 11.10.21
11	Übergabe Kostenprognose und AP	1 Tag	Mit 12.06.19	Mit 12.06.19
12	Prüfung Ausführungsplanung DNS+AG	27 Tage	Don 13.06.19	Fre 19.07.19
13	Bauauftrag der Gemeinde	1 Tag	Mit 17.07.19	Mit 17.07.19
14	Arbeitsvorbereitung	18 Tage	Don 18.07.19	Mon 12.08.19
15	**Beauftragte Leistungen**	**565 Tage**	**Mon 12.08.19**	**Fre 08.10.21**
16	POP FLE Erbau u. Anlieferung	20 Tage	Mon 02.09.19	Fre 27.09.19
17	BSV/ Pflugstrecken	275 Tage	Mon 04.11.19	Fre 20.11.20
18	Winterunterbrechung	20 Tage	Mon 23.12.19	Fre 17.01.20
19	Hilgesdorfer Str. NVT 8-2.17 Behinderung / Unterbrechung durch BKL7	10 Tage	Fre 27.03.20	Don 09.04.20
20	OV FLE - Hasselburg NVT 8-2.2 300m; 6 Behinderung / Unterbrechung durch BKL7	77 Tage	Fre 20.03.20	Son 05.07.20
21	Hasselburg 4.477m NvT 8-2.26-27	31 Tage	Mon 20.01.20	Mon 02.03.20
22	Flechtingen 34.505m NvT 8-2.01-22	189 Tage	Mon 12.08.19	Don 30.04.20
23	Rest-HA Flechtingen	17 Tage	Mon 08.06.20	Die 30.06.20
24	Unterbrechg/ Baustopp NVT 18+19	125 Tage	Mon 26.08.19	Fre 14.02.20
25	NVT 18+19 offene BW in BKL 6/7	84 Tage	Die 18.02.20	Fre 12.06.20
26	Behinderung BKL 7 in Querungen FLE	11 Tage	Mit 15.04.20	Mit 29.04.20
27	Behinderung/ Leistungsminderung durch Corona im Vortrieb	50 Tage	Mon 16.03.20	Fre 22.05.20
28	Unterbrechung HA aufgrund Corona	40 Tage	Mon 16.03.20	Fre 08.05.20
29	nachzuholende Corona HA in Teichwiesen + Lemsell	10 Tage	Mon 15.06.20	Fre 26.06.20
30	Böddensell 6.140m NvT 8-2.23-25	51 Tage	Mon 04.05.20	Mon 13.07.20
31	Hilgesdorf 4.272m NvT 8-2.28	55 Tage	Mit 15.07.20	Die 29.09.20
32	Behnsdorf 12.435m 8-2.29-35	37 Tage	Don 01.10.20	Fre 20.11.20
33	**Winterunterbrechnung**	52 Tage	Fre 18.12.20	Mon 01.03.21
34	Behinderung/ Leistungsminderung durch Corona im Vortrieb	88 Tage	Mon 01.03.21	Mit 30.06.21
35	Belsdorf 5.634m NvT 8-2.36-38	136 Tage	Mon 23.11.20	Mon 31.05.21
36	Kabel einblasen und Montage	314 Tage	Don 18.06.20	Die 31.08.21
37	Dokumentation	545 Tage	Mon 02.09.19	Fre 01.10.21
38	Nachzügler - HA im Gebiet Teil 2	40 Tage	Mon 31.05.21	Fre 23.07.21
39	Dokumentation Nachzügler	60 Tage	Mon 19.07.21	Fre 08.10.21

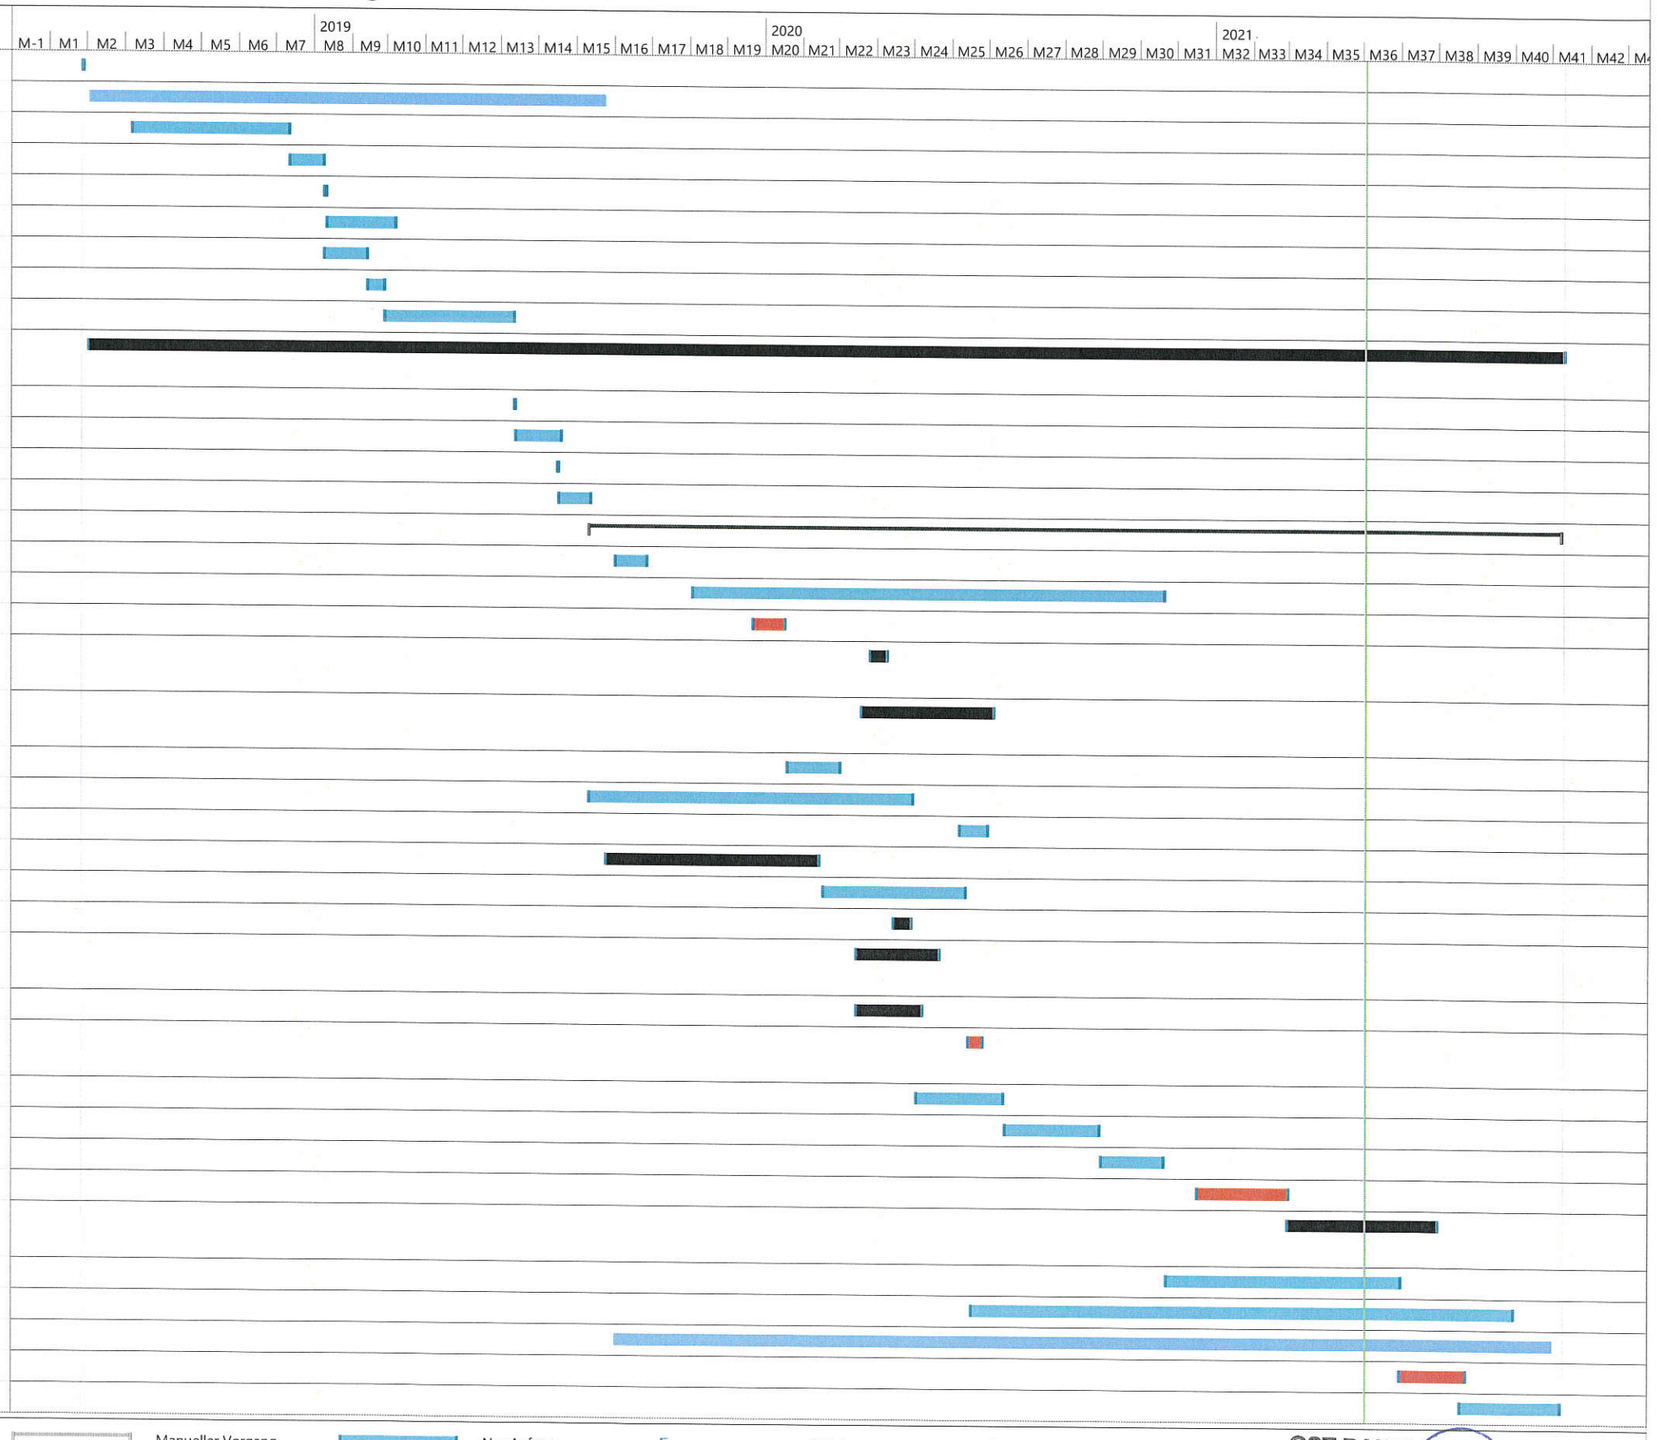

Projekt: 5. BZP Bereich Flechtin
Datum: 05.03.2021

Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag
Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit
Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt
Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein	

OST BAU GmbH
Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau
Am Schaugraben 5
39606 Hansestadt Osterburg (Altmark)
